

	MINUTA DE OBRA	Código: 24IC026-I00-PAC-FREG-0001
		Rev.01
		Página 1 de 6
CONTRATO: "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA - COLCHANE, ETAPA III, REGION DE TARAPACA"		

Actividad:	Verificación de puntos de Roce de Faja	Nº Minuta:	51
Ubicación:	Ruta A-45	Fecha:	01-12-2025
Nombre:	Valentina Aguilera		
Cargo:	Experta en Medio Ambiente		

1. INTRODUCCIÓN

Por medio de este documento se realiza la verificación de los puntos en los cuales el contratista realizó los despejes de roce de faja en la ruta A-45 por solicitud de CONAF para la prevención y mitigación de incendios forestales para el contrato "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias del Tamarugal, Sector Camiña - Colchane, Etapa III, Región de Tarapacá (SAFI 382.772)", sujeto al marco normativo establecido en el Volumen N.º 9 - Estudio y Criterios Ambientales en Proyectos Viales del Manual de Carreteras, Edición 2024.

2. ANTECEDENTES

El presente convenio suscrito entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene por finalidad establecer una alianza estratégica orientada a la prevención y mitigación de incendios forestales en el territorio nacional, especialmente en las zonas de interfaz urbano-rural. El acuerdo pone énfasis en el manejo y reducción de material vegetal combustible, así como en la habilitación de escenarios y especies vegetales que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad para eventuales procesos de evacuación ante situaciones de emergencia.


APRUEBA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CONAF Y EL MOP PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	
Resolución Exenta SOP N°	297
Fecha de Convenio	25 de Agosto del 2025
Fecha de Ingreso a oficina de partes	22 de Septiembre del 2025

	MINUTA DE OBRA	Código: 24IC026-I00-PAC-FREG-0001
		Rev.01
		Página 2 de 6

CONTRATO: "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA - COLCHANE, ETAPA III, REGION DE TARAPACA"



FICHA PLANIFICACIÓN DE OECV 2025

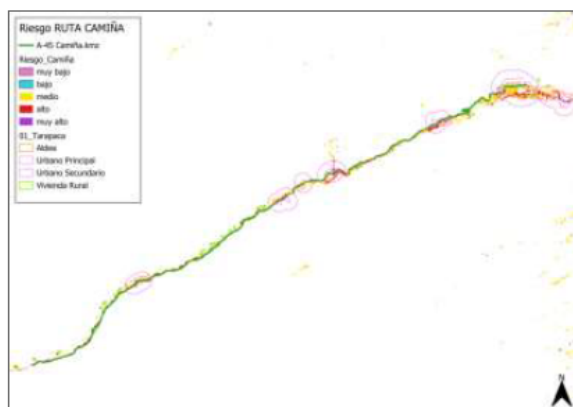

Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo.
- Faja Libre de Vegetación.
- Faja Corta combustible.

Estado de OECV

- Opción 1: Construcción de obra.
- Opción 2: Mantenimiento de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria.
- Uso de cuadrilla con herramientas.
- Ejecutado por terceros (gestión de información).
- Otro tipo de manejo.

UBICACIÓN DE LA OBRA

Nombre de sector: Ruta A – 45 Camiña

Comuna: Camiña

Kilómetros lineales: POR DETERMINAR (Sumarán a la meta regional de 24 kilómetros)

Institución responsable ejecución: Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

La ruta de Camiña contempla un importante tramo de la quebrada. Es posible identificar distintas zonas de interfaz (aldea, urbano principal, urbano secundario, vivienda rural), los niveles de riesgo varían entre media y muy alto.

Este nivel de riesgo y la zona en donde se encuentra la ruta seleccionada que cuenta con una importante actividad de uso del fuego en forma de quemas controladas, además de la data de ocurrencia de incendios forestales, hacen imprescindible que se lleven a cabo este tipo de obras.

Previo a la realización de trabajos se debe llevar a cabo la verificación del tipo de vegetación con motivo de considerar la necesidad de contar con permisos adicionales.

El tipo de OECV que se recomienda para este tramo es: **FAJA CORTAFUEGO PREVENTIVO.**

Faja cortafuego preventivo: Faja de terreno de ancho determinado de acuerdo con la altura de la vegetación circundante, que detiene o dificulta la propagación de un incendio forestal por carecer de vegetación combustible o porque ésta no está en condiciones de arder. Comprende tanto fajas existentes (camino, líneas férreas y cursos de agua, entre otros), como cortafuegos construidos (cortafuego preventivo). A estas fajas se les debe extraer, de forma manual o mecánica, toda la vegetación, excavando el terreno hasta el componente mineral, agregando si corresponde, obras menores para que esta actividad no vaya en detrimento del suelo ni genere riesgo de erosión del sitio.

Ilustración 1: Ficha Justificación Ruta A-45



www.ryq.cl

Consultora@ryq.cl

+562 2339 1700



Miguel Claro 578, Providencia, Chile.



	MINUTA DE OBRA	Código: 24IC026-I00-PAC-FREG-0001
		Rev.01
		Página 3 de 6
CONTRATO: "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA - COLCHANE, ETAPA III, REGION DE TARAPACA"		

3. DESARROLLO

Con fecha 1 de diciembre se efectuó una inspección en la Ruta A-45 con el propósito de verificar los sectores intervenidos mediante labores de roce de faja, ejecutadas por el contratista por solicitud de CONAF en el marco de las acciones preventivas y de mitigación de incendios forestales.

	MINUTA DE OBRA	Código: 24IC026-I00-PAC-FREG-0001
		Rev.01
		Página 4 de 6
CONTRATO: "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA - COLCHANE, ETAPA III, REGION DE TARAPACA"		

4. CONCLUSIÓN

De acuerdo con la inspección en terreno, esta asesoría informa lo siguiente:

- El contratista ejecutó trabajos de roce de faja, consistentes en el corte y despeje de la vegetación ubicada dentro de la faja vial en el sector de la calzada.
- A la fecha, únicamente se han intervenido 5 kilómetros correspondientes al corte de maleza en la faja vial.
- El contratista no ha completado los 24 kilómetros comprometidos en coordinación con MOP y CONAF.
- Se recomienda dar continuidad a los tramos pendientes con el fin de completar el proceso de roce de faja establecido para el contrato de Conservación Vial Camiña-Colchane.
- Se sugiere realizar el despeje de vegetación existente en señalización con tal de no impedir su visibilidad.
- Se sugiere realizar el despeje de vegetación de hasta 3 metros desde el borde de la berma y realizar cortes en ramas que se encuentren a menos de 5 metros por encima de las pistas de circulación.

7.5 FAJA VIAL (7.312.1 Faja Vial)

Toda el área comprendida entre los límites laterales del área fiscal (existan o no cercos), estará limpia de todo elemento extraño como, por ejemplo, escombros, basura, desechos, animales muertos, etc. No deberá existir pasto, arbustos, matorrales o árboles que interfieran con un adecuado escurrimiento de las aguas hacia las obras de saneamiento.

En general, la altura de la vegetación deberá ser menor a 20 cm.

No deberá existir pasto o arbustos que impidan una total visibilidad de la señalización y defensas camineras, o de vehículos o peatones en curvas o intersecciones. En el caso de árboles o matorrales, estos no deberán impedir una total visibilidad de la señalización y defensas camineras, animales, vehículos y peatones a lo largo de todo el camino y hasta 3 m referido desde el borde de la berma.

Los árboles o matorrales deben presentarse firmes y sin ramas colgantes con riesgo de caer sobre las pistas de circulación bermas.

No deberán existir ramas que se encuentren a menos de 5 m por encima de las pistas de circulación.

Ilustración 2: Anexos Complementario de contrato "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias del Tamarugal, Sector Camiña – Colchane, Etapa III, Región de Tarapacá (SAFI 382.772)"

	MINUTA DE OBRA	Código: 24IC026-I00-PAC-FREG-0001
		Rev.01
		Página 5 de 6
CONTRATO: "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA - COLCHANE, ETAPA III, REGION DE TARAPACA"		

FOTOGRAFÍA	RUTA	KM INICIAL	OBSERVACIÓN
	A-45	56.000	Se realiza roce de faja en ruta A-45 por parte del contratista
	A-45	56.800	Se realiza roce de faja en ruta A-45 por parte del contratista
	A-45	57.200	Se realiza roce de faja en ruta A-45 por parte del contratista
	A-45	57.500	Se realiza roce de faja en ruta A-45 por parte del contratista

CONTRATO: "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA - COLCHANE, ETAPA III, REGION DE TARAPACA"

	A-45	58.700	Se realiza roce de faja en ruta A-45 por parte del contratista
	A-45	59.200	Se realiza roce de faja en ruta A-45 por parte del contratista
	A-45	61,900	Se realiza roce de faja en ruta A-45 por parte del contratista

